

Spoštovani,

veseli nas, da tudi vi razmišljate o hitrejši, čistejši, cenejši, predvsem pa kakovostni gradnji s podjetjem Noah d.o.o.. Gradnjo hiš Noah odlikuje visoka kvaliteta, tehnološka dovršenost ter strokovnost, vse od proizvodnje pa do zaključka gradnje.


V podjetju Noah se zelo dobro zavedamo, da skupaj ustvarjamo vaš novi dom, zato vam na celotni poti od začetka do konca ob strani stoji celoten Noah team, ki vam z veseljem svetuje pri vaših odločitvah, odgovarja na vprašanja in vas podpira.

EVA V81



Simbolične slike objekta

TLORIS PRITLIČJA:

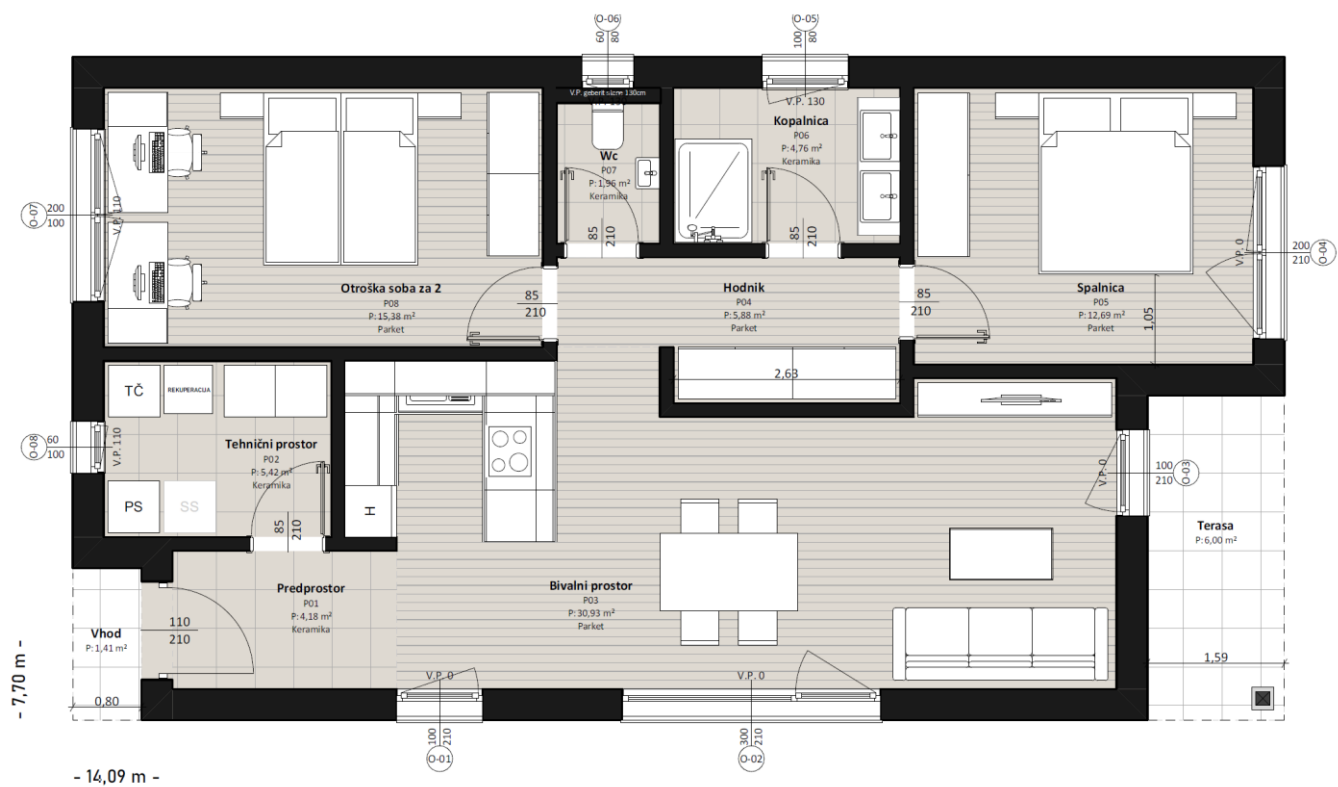

Tip hiše	zajeto		EVA V 81	
Neto kvadratura hiše			81,20 m2***	
Etažnost			P	
Tlorisne dimenzije			14,09 x 7,70 m (pri steni standard +)	
Svetla etažna višina pritličje			2,50 m	
Energijski razred			nizkoenergijska	
ZUNAJ DOKONČAN OBJEKT vsebuje:				
Tip strehe	da	dvokapnica		Naklon: 35 °
Tip ostrešja	da	Palično ostrešje		
Vrsta strešne kritine	da	Betonska, Golob s krovsko kleparskimi deli		
Tip in dolžina napuščev	da	Čelni 30 cm in kapni 80 cm, spodaj zaprti s fasado		
STAVBNO POHIŠTVO:	Da*	PVC bele barve		
ZUNANJE POLICE:	da	ALU		
SENČILA – OPCISKO:	**	Na željo, doplačilo		
KOMARNIKI – OPCISKO:	**	Na željo, doplačilo		
VHODNA VRATA:	1x	tipsko, s pragom (polico) pred vrati		
FASADERSKA DELA:	da	tipsko, Weber, enobarvno		
PROJEKTNJA DOKUMENTACIJA:	da	DGD in PZI		
DELNI KLJUČ vsebuje dodatno še:				
ELEKTRO INŠTALACIJE:	da	tipske		
VODOVOD IN KANALIZACIJA:	da	tipsko		
TLAKI V HIŠI s talnim gretjem:	da	tipski		
NOTRANJE POLICE:	da	tipske		
ZAKLJUČEVANJE STEN:	da	tipsko		
NOAH KLJUČ vsebuje dodatno še:				
TALNE OBLOGE:	da	tipske v vseh prostorih, kjer ni keramike		
KERAMIČARSKA DELA:	da	tipska v prostorih: kopalnica, WC, predprostor, tehnični prostor		
NOTRANJA VRATA:	5 kos	tipsko		
SLIKOPLESKARSKA DELA:	da	tipsko v kvaliteti Q3		
SANITARNA OPREMA v vrednosti: 1.160 EUR + DDV	da	PRITLIČJE:		
		✓ 1x wc školjka s tipko		
		✓ 3x umivalnik z armaturo		
		✓ 1x tuš kad z armaturo		
S FINOMONTAŽO za:				
ELEKTRO INŠTALACIJE:	da	Tipsko, po tabeli v tipski opisi materialov		
OGREVANJE:	da	Tipsko, toplotna črpalka Daikin		

Zaradi lažjega in hitrejšega pregleda je tukaj zgolj strnjen pregled zajetega v ponudbi. Točne opise materialov najdete v ločenem PDF dokumentu – **TIPSKI opisi materialov in možne dodatne opcije**.

	možne izvedbe	standard +
	zunaj dokončan objekt	€ 95.414
	delni ključ	€ 110.721
	NOAH ključ	€ 138.554

cena izbrane izvedbe hiše brez DDV		138.554 €
DDV za objekte do 250 m2 uporabne površine	9,50%	13.162,62 €
Izbrana izvedba z DDV		151.716,51 €

DODATNE OPCIJE/DOPLAČILA	E	ZAJETO	opcija ni v seštevku	Znesek brez DDV
STAVBNO POHIŠTVO:				
Zunanja ALU obloga oken	kpl	NE	1.573 €	
SENČILA:				
Zunanje podometne žaluzije (8 kom)	kpl	NE	3.471 €	
Zunanje podometne rolete (8 kom)	kpl	NE	2.853 €	
KOMARNIKI:				
Komarniki (8 kom)	kpl	NE	1.577 €	
Komarniki pri roletah (8 kom)	kpl	NE	1.263 €	
ELEKTRO OPCIJE:				
El.pogon zunanjih žaluzij (8 kom)	kpl	NE	800 €	
El. Inštalacije za senčila	kpl	NE	560 €	
DRUGO:				
Centralni prezračevalni sist. z rekuperacijo	kpl	DA		7.139 €
Zajete dodatne opcije brez DDV				7.139,00 €
	DDV	9,5%		678,21 €
Dodatne opcije z DDV				7.817,21 €
Skupaj izbrana izvedba hiše z dodatnimi opcijami brez DDV				145.692,89 €
Skupaj izbrana izvedba hiše z dodatnimi opcijami z DDV				159.533,71 €

***POPIS OKEN:**

Prostor	št.okna	opis (odpiranje) okna	širina (mm)	višina (mm)	kos
Bivalni prostor	O-01	enokrilno	1000	2100	1
Bivalni prostor	O-02	fiksno+ enokrilno	3000	2100	1
Bivalni prostor	O-03	enokrilno	1000	2100	1
Spalnica	O-04	dvokrilno	2000	2100	1
Kopalnica	O-05	enokrilno	1000	800	1
WC	O-06	enokrilno	600	800	1
Otroška soba	O-07	dvokrilno	2000	1000	1
Tehnični prostor	O-08	enokrilno	600	1000	1
Skupaj					8

****OPCIJSKO - SENČILA, KOMARNIKI**

Prostor	št.okna	opis (odpiranje) okna	način posluževanja senčila	širina (mm)	višina (mm)	kos	komarnik	kos
Bivalni prostor	O-01	enokrilno	monokomanda	1000	2100	1	plise	1
Bivalni prostor	O-02	fiksno+ enokrilno	monokomanda	3000	2100	1	drsni	1
Bivalni prostor	O-03	enokrilno	monokomanda	1000	2100	1	plise	1
Spalnica	O-04	dvokrilno	monokomanda	2000	2100	1	plise	1
Kopalnica	O-05	enokrilno	monokomanda	1000	800	1	rolo	1
WC	O-06	enokrilno	monokomanda	600	800	1	rolo	1
Otroška soba	O-07	dvokrilno	monokomanda	2000	1000	1	rolo	1
Tehnični prostor	O-08	enokrilno	monokomanda	600	1000	1	rolo	1
Skupaj						8	Skupaj	8

OSTALO

DELA, KI NISO ZAJETA V PONUDBI NOAH:

- geodetski posnetek parcele, geološko geomehansko poročilo, zakoličba objekta, varnostni načrt, nadzornik stranke
- vsa osnovna gradbena dela kot so: zemeljska dela, izvedba temeljne plošče, kleti
- komunalna ureditev parcele
- ureditev okolice
- ograditev gradbišča
- zabojnik za gradbene odpadke in odvoz*
- dobava in montaža svetil
- nadstreški, terase, podnice, pergole, lope ipd.

***V kolikor kupec ne poskrbi za redni odvoz odpadkov (zabojnik ali odvoz min. 2x tedensko) lahko prodajalec naroči zabojnik za odpadke v imenu in na račun kupca!**

Kupec je dolžan urediti in pridobiti elektro-gradbiščno omarico ter uporabo električne energije pri montaži elementov hiše na strošek naročnika/investitorja.

PLAČILNI POGOJI:

PLAČILNI POGOJI - ZUNAJ DOKONČAN OBJEKT *

- 10 % 5 dni po podpisu pogodbe
- 45 % 28 dni pred pričetkom montaže
- 40 % ob zaključku vseh dogovorjenih del
- 5 % po primopredaji objekta

ROKI IZVEDBE:

Za primer podpisa pogodbe **ZUNAJ DOKONČAN OBJEKT** je rok izvedbe **50 DELOVNIH dni** od pričetka montaže objekta.

*izvedba fasade ni vezana na plačilne obroke, saj je odvisna od vremena in se izvede najkasneje do primopredaje objekta

PLAČILNI POGOJI - DELNI KLJUČ*

- 10 % 5 dni po podpisu pogodbe
- 45 % 28 dni pred pričetkom montaže ali takoj po montaži in z ustreznim zavarovanjem plačila
- 15 % po dokončanju grobih strojnih in elektro inštalacij
- 15 % po dokončanju estrihov
- 10 % ob zaključku vseh dogovorjenih del
- 5 % po primopredaji objekta

ROKI IZVEDBE:

Za primer podpisa pogodbe **DELNI KLJUČ** je rok izvedbe **70 DELOVNIH dni** od pričetka montaže objekta.

PLAČILNI POGOJI - NOAH KLJUČ*

- 10 % 5 dni po podpisu pogodbe
- 45 % 28 dni pred pričetkom montaže ali takoj po montaži in z ustreznim zavarovanjem plačila
- 25 % po dokončanju grobih strojnih in elektro inštalacij
- 7 % po izdelavi estrihov
- 8 % po položitvi talnih oblog
- 5 % po primopredaji objekta

ROKI IZVEDBE:

Za primer podpisa pogodbe **NOAH KLJUČ** je rok izvedbe **120 DELOVNIH dni** od pričetka montaže objekta.

V kolikor pride do kombiniranja in dodajanja storitev k naročeni fazi, se rok izvedbe podaljša in individualno dogovori!

VELJAVNOST PONUDBE:

Veljavnost ponudbe: 30 dni od datuma ponudbe. V kolikor ponudba ni datirana velja 30 dni od prejema oz. do preklica oz. do objave novega cenika.

Veselimo se vašega klica in smo vam v primeru vprašanj z veseljem na razpolago.

Z lepimi pozdravi,

Ekipa NOAH

Kontakti:

DUŠAN BEŠTER, dusan@noah.si; 051 248 505

ALENKA GOMBOC, alenka@noah.si; 051 360 433

MELITA VASA, melita@noah.si; 051 335 545

ANDREJA HOHNJEC, andreja@noah.si; 031 723 076

MANJA GRABROVEC, manja@noah.si; 041 711 446

NINA DOVEČAR, nina@noah.si; 08 205 73 93

JASMINA ČORKALO, jasminka@noah.si; 051 248 503
