

Spoštovani,
veseli nas, da tudi vi razmišljate o hitrejši, čistejši, cenejši, predvsem pa kakovostni gradnji s podjetjem Noah d.o.o.. Gradnjo hiš Noah odlikuje visoka kvaliteta, tehnološka dovršenost ter strokovnost, vse od proizvodnje pa do zaključka gradnje.


V podjetju Noah se zelo dobro zavedamo, da skupaj ustvarjamo vaš novi dom, zato vam na celotni poti od začetka do konca ob strani stoji celoten Noah team, ki vam z veseljem svetuje pri vaših odločitvah, odgovarja na vprašanja in vas podpira.

DUO 190 (dvostanovaniska hiša)




Simbolične slike objekta

TLORIS PRITLIČJA:

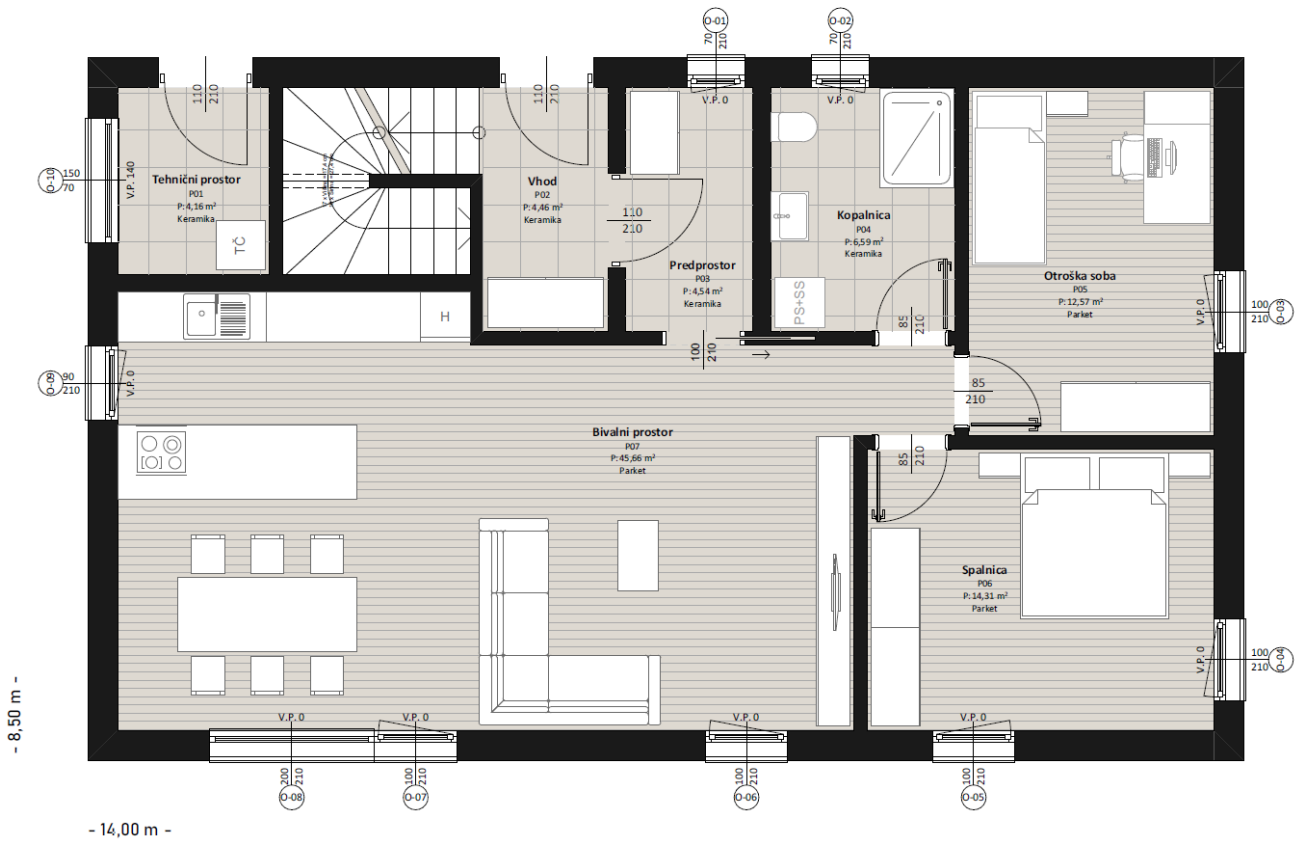

TLORIS NADSTROPJA:

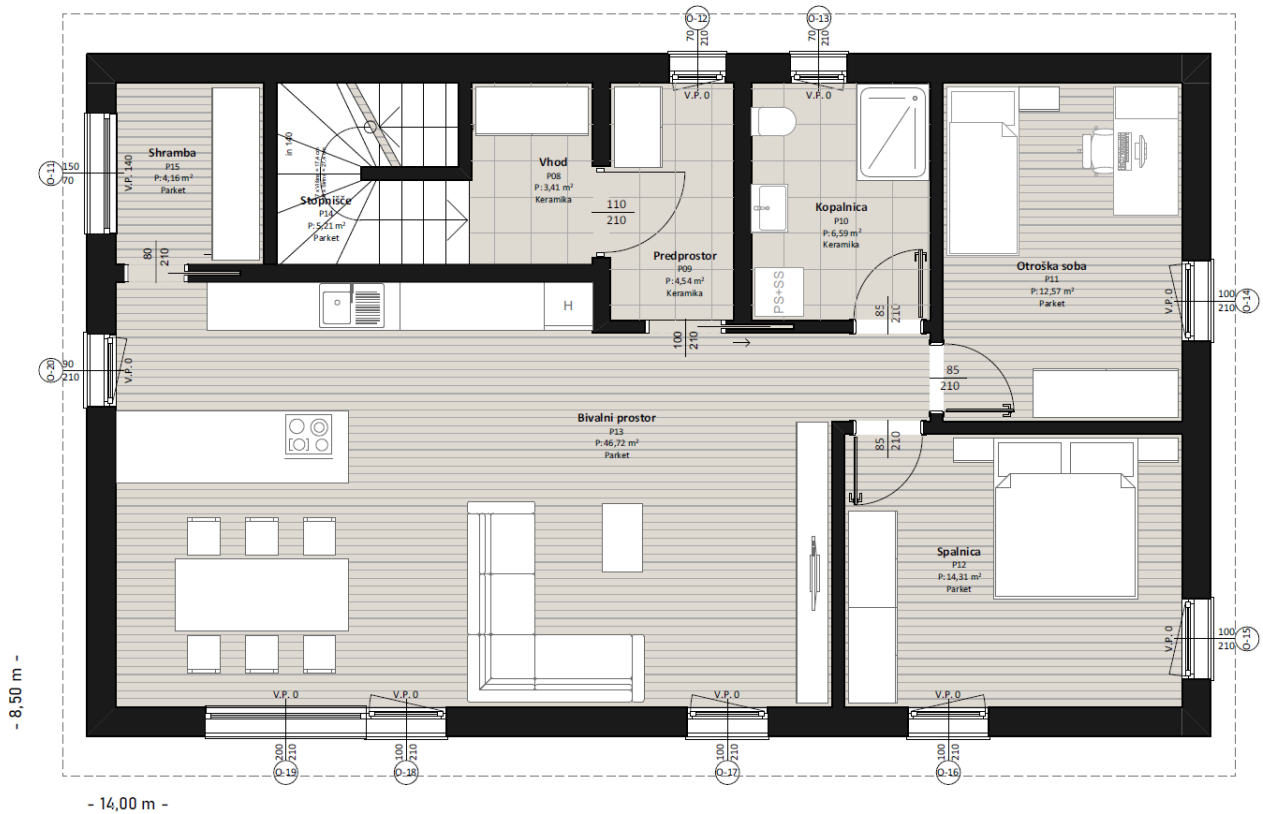

Tip hiše	zajeto	DUO	
Neto kvadratura hiše		189,80 m²	
Etažnost		P+N	
Tlorisne dimenzije		8,62 x 14,12 m (pri steni optimum)	
Svetla etažna višina pritličje		2,50 m	
Svetla etažna višina nadstropje		2,50 m	
Energijski razred		nizkoenergijska	
ZUNAJ DOKONČAN OBJEKT vsebuje:			
Tip strehe	da	dvokapnica	Naklon: 35 °
Tip ostrešja	da	Palično ostrešje	
Vrsta strešne kritine	da	Betonska, Golob s krovsko kleparskimi deli	
Tip in dolžina napuščev	da	Čelni napušči 30cm in kapni napušči 50 cm , spodaj zaprti s fasado	
STOPNICE:	da	tipske (oblečene v keramiko)	
STAVBNO POHIŠTVO:	da*	PVC bele barve	
ZUNANJE POLICE:	da	ALU	
SENČILA – OPCISKO:	**	Na željo, doplačilo	
KOMARNIKI – OPCISKO:	**	Na željo, doplačilo	
VHODNA VRATA:	4x	1x tipsko PIRNAR, s pragom (polico) pred vrati + 3x PVC vhodna vrata (barva bela)	
FASADERSKA DELA:	da	tipsko, Weber, enobarvno	
PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA:	da	DGD in PZI	
DELNI KLJUČ vsebuje dodatno še:			
ELEKTRO INŠTALACIJE:	da	tipske	
VODOVOD IN KANALIZACIJA:	da	tipsko	
TLAKI V HIŠI s talnim gretjem:	da	tipski	
NOTRANJE POLICE:	da	tipske	
ZAKLJUČEVANJE STEN:	da	tipsko	
NOAH KLJUČ vsebuje dodatno še:			
TALNE OBLOGE:	da	tipske v vseh prostorih, kjer ni keramike	
KERAMIČARSKA DELA:	da	tipska v prostorih: tehnični prostor, vhod 2x, predprostor 2x, kopalnica 2x in stopnišče	
OBDELAVA STOPNIC:	da	oblečeno v parket	
NOTRANJA VRATA:	8 kos	Tipsko (6x krilnih, 2x drsna v sreno s kaseto)	
SLIKOPLESKARSKA DELA:	da	tipsko v kvaliteti Q3	
SANITARNA OPREMA v vrednosti: 1.590 EUR + DDV	da	PRITLIČJE: ✓ 1x wc školjka s tipko ✓ 1x umivalnik z armaturo ✓ 1x tuš kad z armaturo	NADSTROPJE: ✓ 1x wc školjka s tipko ✓ 1x umivalnik z armaturo ✓ 1x tuš kad z armaturo
S FINOMONTAŽO za:			
ELEKTRO INŠTALACIJE:	da	Tipsko, po tabeli v tipski opisi materialov	
OGREVANJE:	da	Tipsko, toplotna črpalka Daikin	

Zaradi lažjega in hitrejšega pregleda je tukaj zgolj strnjen pregled zajetega v ponudbi. Točne opise materialov najdete v ločenem PDF dokumentu – **TIPSKI opisi materialov in možne dodatne opcije.**

	možna izvedba	OPTIMUM
	zunaj dokončan objekt	157.185,00 €
	delni ključ	187.870,00 €
	NOAH ključ	236.317,00 €

cena izbrane izvedbe hiše brez DDV		236.317 €
DDV za objekte do 250 m2 uporabne površine	9,50%	22.450,12 €
Izbrana izvedba z DDV		258.767,12 €

DODATNE OPCIJE/DOPLAČILA	E	naročam	opcija ni v seštevku	Znesek brez DDV	
STAVBNO POHIŠTVO:					
Zunanja ALU obloga oken	kpl	NE	3.508 €		
SENČILA:					
Zunanje podometne žaluzije (20 kom)	kpl	NE	8.311 €		
Zunanje podometne rolete (20 kom)	kpl	NE	6.786 €		
KOMARNIKI:					
Komarniki (18 kom)	kpl	NE	2.697 €		
Komarniki pri roletah (18 kom)	kpl	NE	2.426 €		
ELEKTRO OPCIJE:					
El.pogon zunanjih senčil (20 kom)	kpl	NE	2.000 €		
El. Inštalacije senčil (20 kom)	kpl	NE	1.400 €		
STROJNE OPCIJE:					
Ventilator v kopalnici (2 kom)	kpl	NE	600 €		
Ventilator v tehničnem prostoru	kpl	NE	300 €		
SANITARNA OPREMA:					
Sanitarni vodomer in toplotni števec	kpl	NE	600 €		
DRUGO:					
Centralni prezračevalni sist. z rekuperacijo	kpl	DA		14.978 €	
Doplačilo za stopnice obdelane s keramiko	kpl	NE	1.200 €		
Zajete dodatne opcije brez DDV				14.978,00 €	
			DDV	9,5%	1.422,91 €
Dodatne opcije z DDV				16.400,91 €	
Skupaj izbrana izvedba hiše z dodatnimi opcijami brez DDV				251.295,00 €	
Skupaj izbrana izvedba hiše z dodatnimi opcijami z DDV				275.168,03 €	

OPCIJSKO – Sanitarni vodomer in toplotni števec

Za objekte, kjer so manj kot 4 stanovanjske enote, ni predpisanih pravil za delitev stroškov. Vse je dogovor med lastnikoma. Priporočamo vgradnjo sanitarnega vodomerja in toplotnega števca:

EVK 5/130-V-20mm +m Q3=4,0 R40 DN20 M
30oC Modularni sanit. vodomer sistem -V-
SPOJNICA 20mmx25mm Ms

Int-V UltraMaXX qp2,5 S 90oC MID
DN20 Kompaktni ultrazv. toplotni števec
EBS MCE Qn 0,6...2,5 z vmesnim kosom
in Vgradni komplet toplot. števca



Simbolične sli

***POPIS OKEN:**

Prostor	št.okna	opis (odpiranje) okna	širina (mm)	višina (mm)	kos
Predprostor	O-01	enokrilno	700	2100	1
Kopalnica	O-02	enokrilno	700	2100	1
Otroška soba	O-03	enokrilno	1000	2100	1
Spalnica	O-04	enokrilno	1000	2100	1
Spalnica	O-05	enokrilno	1000	2100	1
Bivalni prostor	O-06	enokrilno	1000	2100	1
Jedilnica	O-07	enokrilno spojeno z O-08	1000	2100	1
Jedilnica	O-08	fiksno spojeno z O-07	2000	2100	1
Kuhinja	O-09	enokrilno	900	2100	1
Tehnični prostor	O-10	kip	1500	700	1
Predprostor	O-11	deljeno: sp.fiksno, zg.enokrilno	700	2100	1
Kopalnica	O-12	deljeno: sp.fiksno, zg.enokrilno	700	2100	1
Otroška soba	O-13	deljeno: sp.fiksno, zg.enokrilno	1000	2100	1
Spalnica	O-14	deljeno: sp.fiksno, zg.enokrilno	1000	2100	1
Spalnica	O-15	deljeno: sp.fiksno, zg.enokrilno	1000	2100	1
Bivalni prostor	O-16	deljeno: sp.fiksno, zg.enokrilno	1000	2100	1
Jedilnica	O-17	deljeno: sp.fiksno, zg.enokrilno spojeno z O-18	1000	2100	1
Jedilnica	O-18	fiksno spojeno z O-17	2000	2100	1
Kuhinja	O-19	deljeno: sp.fiksno, zg.enokrilno	900	2100	1
Shramba	O-20	kip	1500	700	1
Skupaj					20

****OPCIJSKO - SENČILA, KOMARNIKI**

Prostor	št.okna	opis (odpiranje) okna	način posluževanja senčila	širina (mm)	višina (mm)	kos	komarnik	kos
Predprostor	O-01	enokrilno	monokomanda	700	2100	1	rolo	1
Kopalnica	O-02	enokrilno	monokomanda	700	2100	1	rolo	1
Otroška soba	O-03	enokrilno	monokomanda	1000	2100	1	plise	1
Spalnica	O-04	enokrilno	monokomanda	1000	2100	1	plise	1
Spalnica	O-05	enokrilno	monokomanda	1000	2100	1	plise	1
Bivalni prostor	O-06	enokrilno	monokomanda	1000	2100	1	plise	1
Jedilnica	O-07	enokrilno spojeno z O-08	monokomanda	1000	2100	1	plise	1
Jedilnica	O-08	fiksno spojeno z O-07	monokomanda	2000	2100	1	brez	0
Kuhinja	O-09	enokrilno	monokomanda	900	2100	1	plise	1
Tehnični prostor	O-10	kip	monokomanda	1500	700	1	fiksni	1
Predprostor	O-11	deljeno: sp.fiksno, zg.enokrilno	monokomanda	700	2100	1	rolo	1
Kopalnica	O-12	deljeno: sp.fiksno, zg.enokrilno	monokomanda	700	2100	1	rolo	1
Otroška soba	O-13	deljeno: sp.fiksno, zg.enokrilno	monokomanda	1000	2100	1	rolo	1
Spalnica	O-14	deljeno: sp.fiksno, zg.enokrilno	monokomanda	1000	2100	1	rolo	1
Spalnica	O-15	deljeno: sp.fiksno, zg.enokrilno	monokomanda	1000	2100	1	rolo	1
Bivalni prostor	O-16	deljeno: sp.fiksno, zg.enokrilno	monokomanda	1000	2100	1	rolo	1
Jedilnica	O-17	deljeno: sp.fiksno, zg.enokrilno spojeno z O-18	monokomanda	1000	2100	1	rolo	1
Jedilnica	O-18	fiksno spojeno z O-17	monokomanda	2000	2100	1	brez	0
Kuhinja	O-19	deljeno: sp.fiksno, zg.enokrilno	monokomanda	900	2100	1	rolo	1
Shramba	O-20	kip	monokomanda	1500	700	1	fiksni	1
Skupaj						20	Skupaj	18

OSTALO

DELA, KI NISO ZAJETA V PONUDBI NOAH:

- geodetski posnetek parcele, geološko geomehansko poročilo, zakoličba objekta, varnostni načrt, nadzornik stranke
- vsa osnovna gradbena dela kot so: zemeljska dela, izvedba temeljne plošče, kleti
- komunalna ureditev parcele
- ureditev okolice
- ograditev gradbišča
- zabojnik za gradbene odpadke in odvoz*
- dobava in montaža svetil
- nadstreški, terase, podnice, pergole, lope ipd.

***V kolikor kupec ne poskrbi za redni odvoz odpadkov (zabojnik ali odvoz min. 2x tedensko) lahko prodajalec naroči zabojnik za odpadke v imenu in na račun kupca!**

Kupec je dolžan urediti in pridobiti elektro-gradbiščno omarico ter uporabo električne energije pri montaži elementov hiše na strošek naročnika/investitorja.

PLAČILNI POGOJI:

PLAČILNI POGOJI - ZUNAJ DOKONČAN OBJEKT *

- 10 % 5 dni po podpisu pogodbe
- 45 % 28 dni pred pričetkom montaže
- 40 % ob zaključku vseh dogovorjenih del
- 5 % po primopredaji objekta

ROKI IZVEDBE:

Za primer podpisa pogodbe **ZUNAJ DOKONČAN OBJEKT** je rok izvedbe **50 DELOVNIH dni** od pričetka montaže objekta.

*izvedba fasade ni vezana na plačilne obroke, saj je odvisna od vremena in se izvede najkasneje do primopredaje objekta

PLAČILNI POGOJI - DELNI KLJUČ*

- 10 % 5 dni po podpisu pogodbe
- 45 % 28 dni pred pričetkom montaže ali takoj po montaži in z ustreznim zavarovanjem plačila
- 15 % po dokončanju grobih strojnih in elektro inštalacij
- 15 % po dokončanju estrihov
- 10 % ob zaključku vseh dogovorjenih del
- 5 % po primopredaji objekta

ROKI IZVEDBE:

Za primer podpisa pogodbe **DELNI KLJUČ** je rok izvedbe **70 DELOVNIH dni** od pričetka montaže objekta.

PLAČILNI POGOJI - NOAH KLJUČ*

- 10 % 5 dni po podpisu pogodbe
- 45 % 28 dni pred pričetkom montaže ali takoj po montaži in z ustreznim zavarovanjem plačila
- 25 % po dokončanju grobih strojnih in elektro inštalacij
- 7 % po izdelavi estrihov
- 8 % po položitvi talnih oblog
- 5 % po primopredaji objekta

ROKI IZVEDBE:

Za primer podpisa pogodbe **NOAH KLJUČ** je rok izvedbe **120 DELOVNIH dni** od pričetka montaže objekta.

V kolikor pride do kombiniranja in dodajanja storitev k naročeni fazi, se rok izvedbe podaljša in individualno dogovori!

VELJAVNOST PONUDBE:

Veljavnost ponudbe: 30 dni od datuma ponudbe. V kolikor ponudba ni datirana velja 30 dni od prejema oz. do preklica oz. do objave novega cenika.

Veselimo se vašega klica in smo vam v primeru vprašanj z veseljem na razpolago.

Z lepimi pozdravi,

Ekipa NOAH

Kontakti:

DUŠAN BEŠTER, dusan@noah.si; 051 248 505

ALENKA GOMBOC, alenka@noah.si; 051 360 433

MELITA VASA, melita@noah.si; 051 335 545

ANDREJA HOHNJEC, andreja@noah.si; 031 723 076

MANJA GRABROVEC, manja@noah.si; 041 711 446

NINA DOVEČAR, nina@noah.si; 08 205 73 93

JASMINA ČORKALO, jasmina@noah.si; 051 248 503
