

Spoštovani,
veseli nas, da tudi vi razmišljate o hitrejši, čistejši, cenejši, predvsem pa kakovostni gradnji s podjetjem Noah d.o.o.. Gradnjo hiš Noah odlikuje visoka kvaliteta, tehnološka dovršenost ter strokovnost, vse od proizvodnje pa do zaključka gradnje.

V podjetju Noah se zelo dobro zavedamo, da skupaj ustvarjamo vaš novi dom, zato vam na celotni poti od začetka do konca ob strani stoji celoten Noah team, ki vam z veseljem svetuje pri vaših odločitvah, odgovarja na vprašanja in vas podpira.


KLASIK 130




Simbolične slike objekta



TLORIS PRITLIČJA:

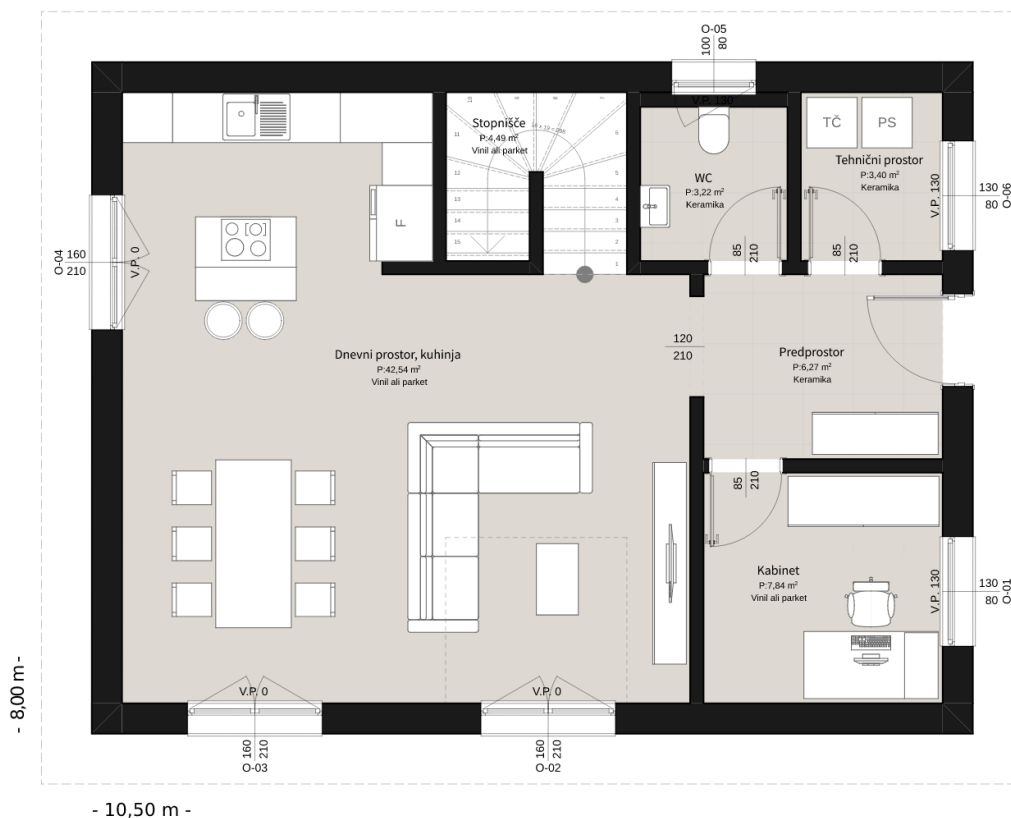

TLORIS MANSARDA:

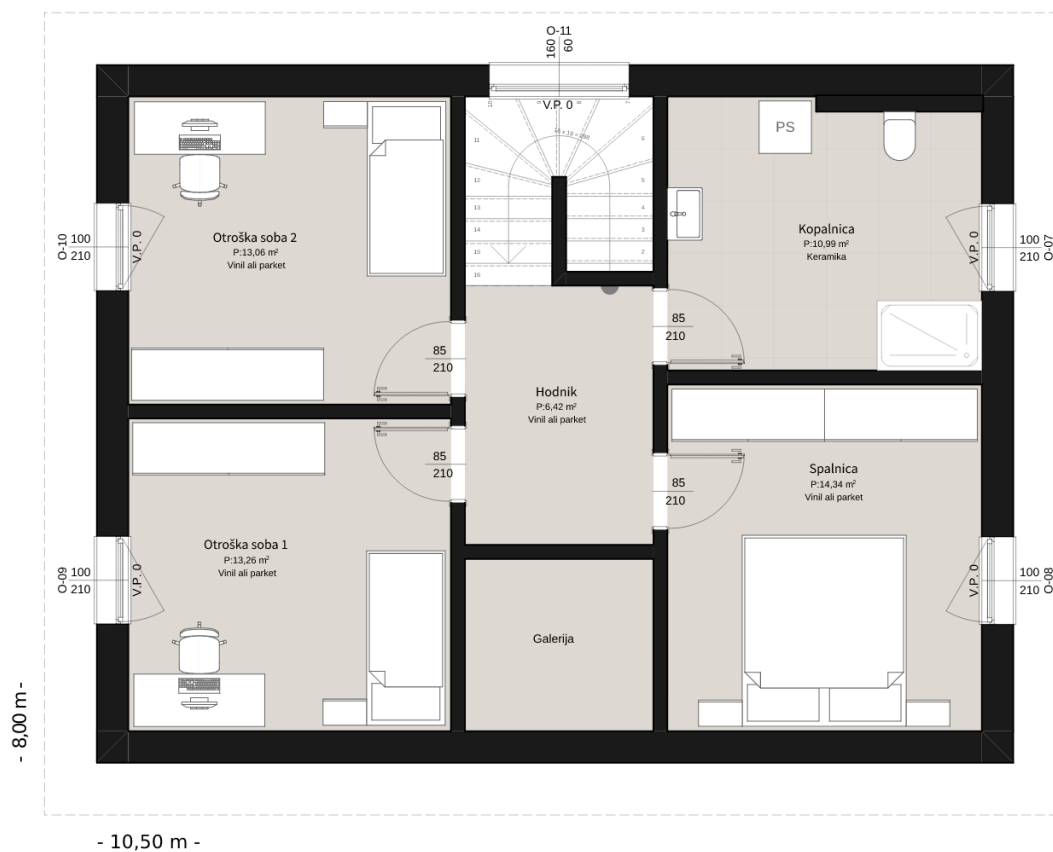

Tip hiše	zajeto			KLASIK 130
Neto kvadratura hiše			129,89 m2***	
Etažnost			P+M	
Tlorisne dimenzije			8,00 x 10,50 m (pri steni standard +)	
Svetla etažna višina pritličje			2,50 m	
Svetla etažna višina nadstropje			2,50 m	
Kolenska stena (svetla mera)			1,30 m	
Energijski razred			nizkoenergijska	
ZUNAJ DOKONČAN OBJEKT vsebuje:				
Tip strehe	da	dvokapnica		Naklon: 40 °
Tip ostrešja	da	Klasično ostrešje		
Vrsta strešne kritine	da	Betonska, Golob s krovsko kleparskimi deli		
Tip in dolžina napuščev	da	Čelni in kapni 60 cm, obdelani s fasado		
STOPNICE:	da	tipske		
STAVBNO POHIŠTVO:	Da*	PVC bele barve		
ZUNANJE POLICE:	da	ALU		
SENČILA – OPCISKO:	**	Na željo, doplačilo		
KOMARNIKI – OPCISKO:	**	Na željo, doplačilo		
VHODNA VRATA:	1x	tipsko, s pragom (polico) pred vrati		
FASADERSKA DELA:	da	tipsko, Weber, enobarvno		
PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA:	da	DGD in PZI		
DELNI KLJUČ vsebuje dodatno še:				
ELEKTRO INŠTALACIJE:	da	tipske		
VODOVOD IN KANALIZACIJA:	da	tipsko		
TLAKI V HIŠI s talnim gretjem:	da	tipski		
NOTRANJE POLICE:	da	tipske		
ZAKLJUČEVANJE STEN:	da	tipsko		
NOAH KLJUČ vsebuje dodatno še:				
TALNE OBLOGE:	da	tipske v vseh prostorih, kjer ni keramike		
KERAMIČARSKA DELA:	da	tipska v prostorih: kopalnica, WC, predprostor, tehnični prostor		
OBDELAVA STOPNIC:	da	tipsko, v kolikor gre za nadstropno hišo, drugače brez		
NOTRANJA VRATA:	7 kos	tipsko		
SLIKOPLESKARSKA DELA:	da	tipsko v kvaliteti Q3		
SANITARNA OPREMA v vrednosti: 1.290 EUR + DDV	da	PRITLIČJE: ✓ 1x wc školjka s tipko ✓ 1x umivalnik z armaturo		NADSTROPJE: ✓ 1x wc školjka s tipko ✓ 1x umivalnik z armaturo ✓ 1x tuš kad z armaturo
S FINOMONTAŽO za:				
ELEKTRO INŠTALACIJE:	da	Tipsko, po tabeli v tipski opisi materialov		
OGREVANJE:	da	Tipsko, toplotna črpalka Daikin		

Zaradi lažjega in hitrejšega pregleda je tukaj zgolj strnjen pregled zajetega v ponudbi. Točne opise materialov najdete v ločenem PDF dokumentu – **TIPSKI opisi materialov in možne dodatne opcije.**

	možne izvedbe	standard +
	zunaj dokončan objekt	€ 114.354
	delni ključ	€ 135.460
	NOAH ključ	€ 173.669

cena izbrane izvedbe hiše brez DDV		173.669 €
DDV za objekte do 250 m2 uporabne površine	9,50%	16.498,55 €
izbrana izvedba z DDV		190.167,52 €

DODATNE OPCIJE/DOPLAČILA	E	naročam	opcija ni v seštevku	Znesek brez DDV
STAVBNO POHIŠTVO:				
Zunanja ALU obloga oken	kpl	DA/NE	1.884 €	
SENČILA:				
Zunanje podometne žaluzije (11 kom)	kpl	DA/NE	4.625 €	
Zunanje podometne rolete (11 kom)	kpl	DA/NE	3.565 €	
KOMARNIKI:				
Komarniki (10 kom)	kpl	DA/NE	2.161 €	
Komarniki pri roletah (10 kom)	kpl	DA/NE	1.986 €	
ELEKTRO OPCIJE:				
El.pogon zunanjih senčil (11 kom)	kpl	DA/NE	1.100 €	
El. Inštalacije za senčila	kpl	DA/NE	770 €	
DRUGO:				
Centralni prezračevalni sist. z rekuperacijo	kpl	DA		9.993 €
Zajete dodatne opcije brez DDV				9.993,00 €
		DDV	9,5%	949,34 €
Dodatne opcije z DDV				10.942,34 €
Skupaj izbrana izvedba hiše z dodatnimi opcijami brez DDV				183.661,97 €
Skupaj izbrana izvedba hiše z dodatnimi opcijami z DDV				201.109,86 €

***POPIS OKEN:**

Prostor	št.okna	opis (odpiranje) okna	širina (mm)	višina (mm)	kos
Kabinet	O-01	enokrilno	1300	800	1
Dnevna soba	O-02	dvokrilno	1600	2100	1
Jedilnica	O-03	dvokrilno	1600	2100	1
Kuhinja	O-04	dvokrilno	1600	2100	1
Stopnišče	O-05	kip	1600	600	1
WC	O-06	enokrilno	1000	800	1
Tehnični prostor	O-07	enokrilno	1300	800	1
Kopalnica	O-08	sp. fiksno + zg. enokrilno	1000	2100	1
Spalnica	O-09	sp. fiksno + zg. enokrilno	1000	2100	1
Otroška soba 1	O-10	sp. fiksno + zg. enokrilno	1000	2100	1
Otroška soba 2	O-11	sp. fiksno + zg. enokrilno	1000	2100	1
Skupaj					11

****OPCIJSKO - SENČILA, KOMARNIKI**

Prostor	št.okna	opis (odpiranje) okna	način posluževanja senčila	širina (mm)	višina (mm)	kos	komarnik	kos
Kabinet	O-01	enokrilno	monokomanda	1300	800	1	rolo	1
Dnevna soba	O-02	dvokrilno	monokomanda	1600	2100	1	plise	1
Jedilnica	O-03	dvokrilno	monokomanda	1600	2100	1	plise	1
Kuhinja	O-04	dvokrilno	monokomanda	1600	2100	1	plise	1
Stopnišče	O-05	kip	monokomanda	1600	600	1	fiksni	1
WC	O-06	enokrilno	monokomanda	1000	800	1	rolo	1
Tehnični prostor	O-07	enokrilno	monokomanda	1300	800	1	rolo	1
Kopalnica	O-08	sp. fiksno + zg. enokrilno	monokomanda	1000	2100	1	rolo	1
Spalnica	O-09	sp. fiksno + zg. enokrilno	monokomanda	1000	2100	1	rolo	1
Otroška soba 1	O-10	sp. fiksno + zg. enokrilno	monokomanda	1000	2100	1	rolo	1
Otroška soba 2	O-11	sp. fiksno + zg. enokrilno	monokomanda	1000	2100	1	rolo	1
Skupaj						11	Skupaj	11

OSTALO

DELA, KI NISO ZAJETA V PONUDBI NOAH:

- geodetski posnetek parcele, geološko geomehansko poročilo, zakoličba objekta, varnostni načrt, nadzornik stranke
- vsa osnovna gradbena dela kot so: zemeljska dela, izvedba temeljne plošče, kleti
- komunalna ureditev parcele
- ureditev okolice
- ograditev gradbišča
- zabojnik za gradbene odpadke in odvoz*
- dobava in montaža svetil
- nadstreški, terase, podnice, pergole, lope ipd.

***V kolikor kupec ne poskrbi za redni odvoz odpadkov (zabojnik ali odvoz min. 2x tedensko) lahko prodajalec naroči zabojnik za odpadke v imenu in na račun kupca!**

Kupec je dolžan urediti in pridobiti elektro-gradbiščno omarico ter uporabo električne energije pri montaži elementov hiše na strošek naročnika/investitorja.

PLAČILNI POGOJI:

PLAČILNI POGOJI - ZUNAJ DOKONČAN OBJEKT *

10 % 5 dni po podpisu pogodbe
45 % 28 dni pred pričetkom
montaže

40 % ob zaključku vseh
dogovorjenih del
5 % po primopredaji objekta

ROKI IZVEDBE:

Za primer podpisa pogodbe **ZUNAJ
DOKONČAN OBJEKT** je rok izvedbe
50 DELOVNIH dni od pričetka
montaže objekta.

*izvedba fasade ni vezana na plačilne obroke, saj je odvisna od vremena in se izvede najkasneje do primopredaje objekta

PLAČILNI POGOJI - DELNI KLJUČ*

10 % 5 dni po podpisu pogodbe
45 % 28 dni pred pričetkom montaže ali
tako po montaži in z ustreznim
zavarovanjem plačila
15 % po dokončanju grobih strojnih in
elektro inštalacij
15 % po dokončanju estrihov
10 % ob zaključku vseh dogovorjenih del
5 % po primopredaji objekta

ROKI IZVEDBE:

Za primer podpisa pogodbe **DELNI KLJUČ** je
rok izvedbe **70 DELOVNIH dni** od pričetka
montaže objekta.

PLAČILNI POGOJI - NOAH KLJUČ*

10 % 5 dni po podpisu pogodbe
45 % 28 dni pred pričetkom montaže ali
tako po montaži in z ustreznim
zavarovanjem plačila
25 % po dokončanju grobih strojnih in
elektro inštalacij
7 % po izdelavi estrihov
8 % po položitvi talnih oblog
5 % po primopredaji objekta

ROKI IZVEDBE:

Za primer podpisa pogodbe **NOAH KLJUČ** je
rok izvedbe **120 DELOVNIH dni** od pričetka
montaže objekta.

**V kolikor pride do kombiniranja in dodajanja storitev k naročeni fazi, se rok izvedbe podaljša
in individualno dogovori!**

VELJAVNOST PONUDBE:

Veljavnost ponudbe: 30 dni od datuma ponudbe. V kolikor ponudba ni datirana velja 30 dni od prejema oz. do preklica oz. do objave novega cenika.

Veselim se vašega klica in smo vam v primeru vprašanj z veseljem na razpolago.

Z lepimi pozdravi,

Ekipa NOAH

Kontakti:

DUŠAN BEŠTER, dusan@noah.si; 051 248 505

ALENKA GOMBOC, alenka@noah.si; 051 360 433

MELITA VASA, melita@noah.si; 051 335 545

ANDREJA HOHNJEC, andreja@noah.si; 031 723 076

MANJA GRABROVEC, manja@noah.si; 041 711 446

NINA DOVEČAR, nina@noah.si; 08 205 73 93

JASMINA ČORKALO, jasmina@noah.si; 051 248 503
