

Spoštovani,

veseli nas, da tudi vi razmišljate o hitrejši, čistejši, cenejši, predvsem pa kakovostni gradnji s podjetjem Noah d.o.o.. Gradnjo hiš Noah odlikuje visoka kvaliteta, tehnološka dovršenost ter strokovnost, vse od proizvodnje pa do zaključka gradnje.

V podjetju Noah se zelo dobro zavedamo, da skupaj ustvarjamo vaš novi dom, zato vam na celotni poti od začetka do konca ob strani stoji celoten Noah team, ki vam z veseljem svetuje pri vaših odločitvah, odgovarja na vprašanja in vas podpira.



PRIZMA X 144





Simbolične slike objekta

TLORIS PRITLIČJA:

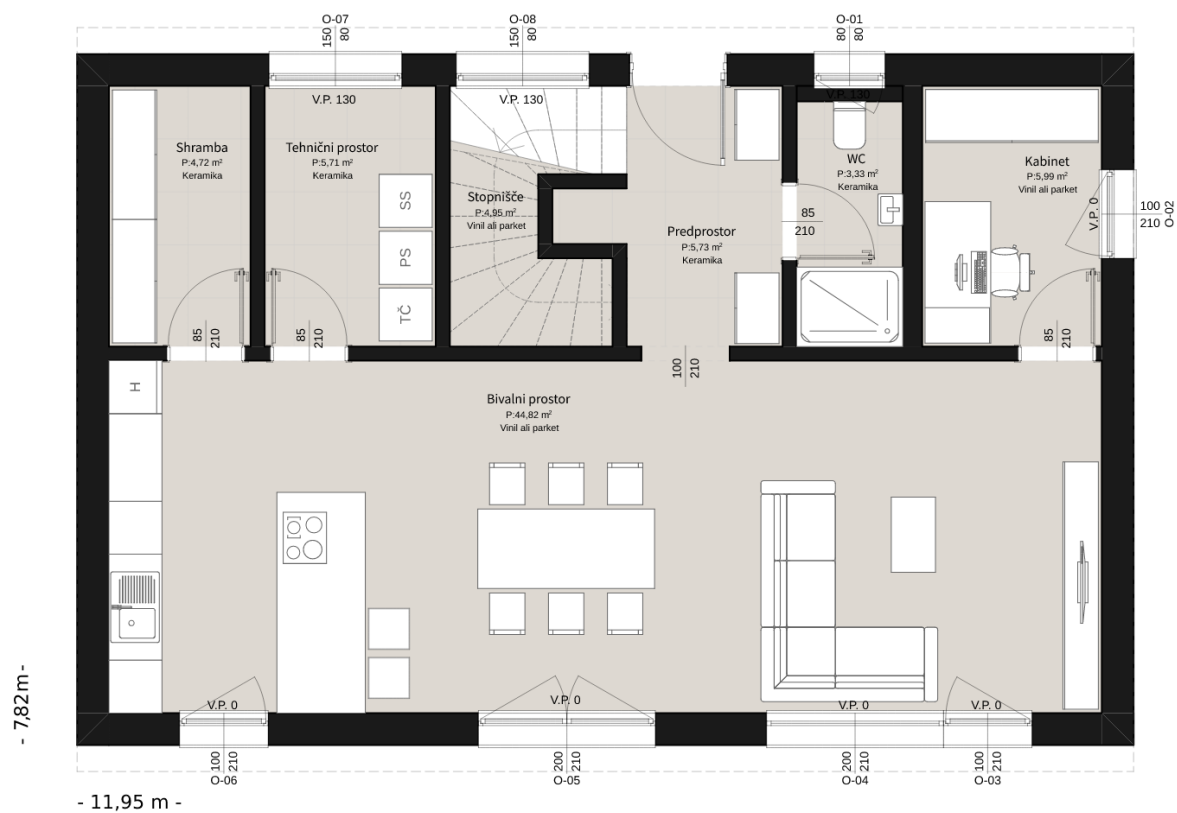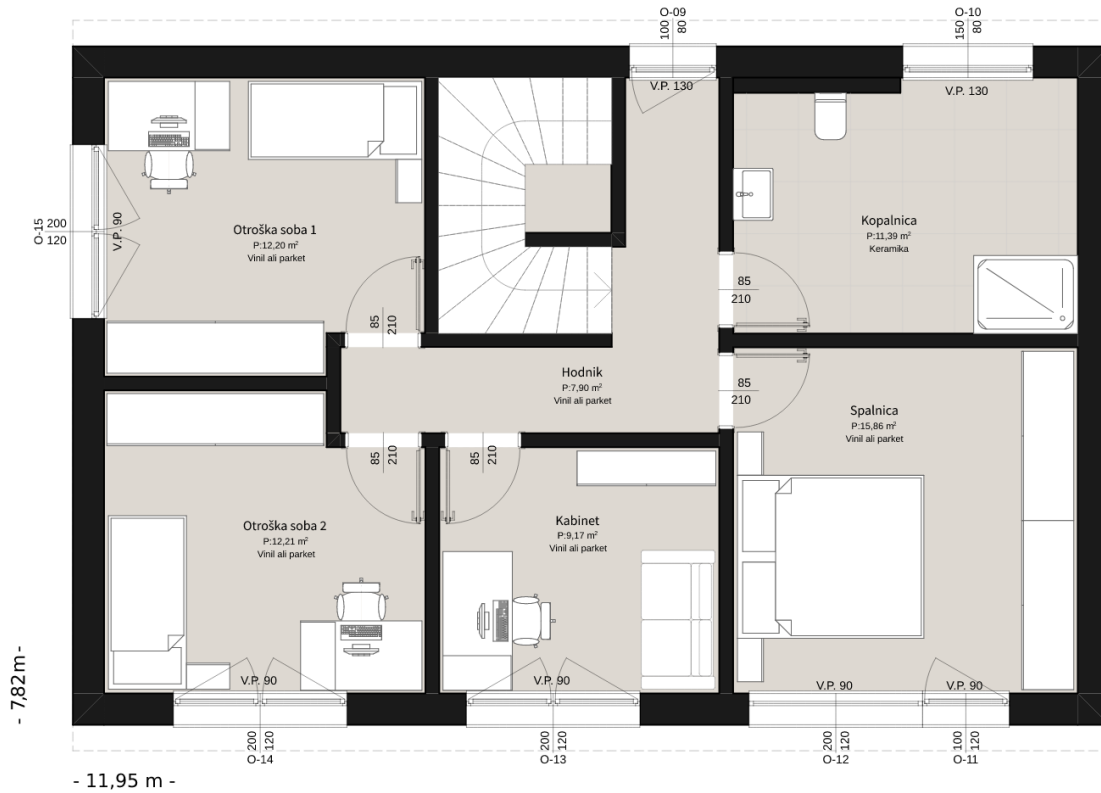

Tip hiše	zajeto		PRIZMA V 144
Neto kvadratura hiše		144,75 m2***	
Etažnost		P+N	
Tlorisne dimenzije		12,07 x 7,94 m (pri steni optimum)	
Svetla etažna višina pritličje		2,50 m	
Svetla etažna višina nadstropje		2,50 m	
Energijski razred		nizkoenergijska	
ZUNAJ DOKONČAN OBJEKT vsebuje:			
Tip strehe	da	štirikapnica	Naklon: 25 °
Tip ostrešja	da	Klasično ostrešje	
Vrsta strešne kritine	da	Betonska, Golob s krovsko kleparskimi deli	
Tip in dolžina napuščev	da	Čelni in kapni 70 cm, spodaj zaprti s fasado	
STOPNICE:	da	tipske	
STAVBNO POHIŠTVO:	Da*	PVC bele barve	
ZUNANJE POLICE:	da	ALU	
SENČILA – OPCISKO:	**	Na željo, doplačilo	
KOMARNIKI – OPCISKO:	**	Na željo, doplačilo	
VHODNA VRATA:	1x	tipsko, s pragom (polico) pred vrati	
FASADERSKA DELA:	da	tipsko, Weber, enobarvno	
PROJEKTNÁ DOKUMENTACIJA:	da	DGD in PZI	
DELNI KLJUČ vsebuje dodatno še:			
ELEKTRO INŠTALACIJE:	da	tipske	
VODOVOD IN KANALIZACIJA:	da	tipsko	
TLAKI V HIŠI s talnim gretjem:	da	tipski	
NOTRANJE POLICE:	da	tipske	
ZAKLJUČEVANJE STEN:	da	tipsko	
NOAH KLJUČ vsebuje dodatno še:			
TALNE OBLOGE:	da	tipske v vseh prostorih, kjer ni keramike	
KERAMIČARSKA DELA:	da	tipska v prostorih: kopalnica, WC, predprostor, tehnični prostor, shramba	
OBDELAVA STOPNIC:	da	tipsko, v kolikor gre za nadstropno hišo, drugače brez	
NOTRANJA VRATA:	9 kos	tipsko	
SLIKOPLESKARSKA DELA:	da	tipsko v kvaliteti Q3	
SANITARNA OPREMA v vrednosti: 1.650 EUR + DDV	da	PRITLIČJE: ✓ 1x wc školjka s tipko ✓ 1x umivalnik z armaturo ✓ 1x tuš kad z armaturo	NADSTROPJE: ✓ 1x wc školjka s tipko ✓ 1x umivalnik z armaturo ✓ 1x tuš kad z armaturo
S FINOMONTAŽO za:			
ELEKTRO INŠTALACIJE:	da	Tipsko, po tabeli v tipski opisi materialov	
OGREVANJE:	da	Tipsko, toplotna črpalka Daikin	

Zaradi lažjega in hitrejšega pregleda je tukaj zgolj strnjen pregled zajetega v ponudbi. Točne opise materialov najdete v ločenem PDF dokumentu – **TIPSKI opisi materialov in možne dodatne opcije**.
 ***Kvadrature prostorov so povzete po vpisanih kvadraturah v prejetem načrtu (ali so manjkajoče izmerjene približno). V kolikor se kasneje ugotovi, da se navedbe razhajajo od dejanskih, se bo razlika obračunala. To ne velja, kadar IZP, DGD, načrte dela NOAH in je ponudba pripravljena po načrtih NOAH.

	možna izvedba	OPTIMUM
	zunaj dokončan objekt	127.805,00 €
	delni ključ	151.786,00 €
	NOAH ključ	193.141,00 €

cena izbrane izvedbe hiše brez DDV		193.141 €
DDV za objekte do 250 m2 uporabne površine	9,50%	18.348,40 €
Izbrana izvedba z DDV		211.489,40 €

DODATNE OPCIJE/DOPLAČILA	E	ZAJETO	opcija ni v seštevku	Znesek brez DDV
STAVBNO POHIŠTVO:				
Zunanja ALU obloga oken	kpl	NE	2.552 €	
SENČILA:				
Zunanje podometne žaluzije (15 kom)	kpl	NE	6.368 €	
Zunanje podometne rolete (15 kom)	kpl	NE	4.625 €	
KOMARNIKI:				
Komarniki (16 kom)	kpl	NE	2.208 €	
Komarniki pri roletah (16 kom)	kpl	NE	1.606 €	
ELEKTRO OPCIJE:				
El.pogon zunanjih žaluzij (15 kom)	kpl	NE	1.500 €	
El. inštalacije za senčila (15 kom)	kpl	NE	1.050 €	
DRUGO:				
Centralni prezračevalni sist. z rekuperacijo	kpl	NE	11.886 €	
Zajete dodatne opcije brez DDV				0,00 €
DDV			9,5%	0,00 €
Dodatne opcije z DDV				0,00 €
Skupaj izbrana izvedba hiše z dodatnimi opcijami brez DDV				193.141,00 €
Skupaj izbrana izvedba hiše z dodatnimi opcijami z DDV				211.489,40 €

***POPIS OKEN:**

Prostor	št.okna	opis (odpiranje) okna	širina (mm)	višina (mm)	kos
WC	O-01	enokrilno	800	800	1
KABINET	O-02	enokrilno	1000	2100	1
DNEVNI PROSTOR	O-03	enokrilno spojeno z O-04	1000	2100	1
DNEVNI PROSTOR	O-04	fiksno spojeno z O-03	2000	2100	1
JEDILNICA	O-05	dvokrilno	2000	2100	1
KUHINJA	O-06	enokrilno	1000	2100	1
TEHNIČNI PROSTOR	O-07	kip	1500	800	1
STOPNIŠČE	O-08	kip	1500	800	1
HODNIK	O-09	enokrilno	1000	800	1
KOPALNICA	O-10	kip	1500	800	1
SPALNICA	O-11	enokrilno spojeno z O-12	1000	1200	1
SPALNICA	O-12	fiksno spojeno z O-11	2000	1200	1
KABINET	O-13	dvokrilno s pokončnikom	2000	1200	1
OTORŠKA SOBA 2	O-14	dvokrilno s pokončnikom	2000	1200	1
OTROŠKA SOBA 1	O-15	dvokrilno s pokončnikom	2000	1200	1
Skupaj					15

****OPCIJSKO - SENČILA, KOMARNIKI**

Prostor	št.okna	opis (odpiranje) okna	način posluževanja senčila	širina (mm)	višina (mm)	kos	komarnik	kos
WC	O-01	enokrilno	monokomanda	800	800	1	fiksni	1
KABINET	O-02	enokrilno	monokomanda	1000	2100	1	plise	1
DNEVNI PROSTOR	O-03	enokrilno spojeno z O-04	monokomanda	1000	2100	1	plise	1
DNEVNI PROSTOR	O-04	fiksno spojeno z O-03	monokomanda	2000	2100	1	/	0
JEDILNICA	O-05	dvokrilno	monokomanda	2000	2100	1	drsni 1/2	1
KUHINJA	O-06	enokrilno	monokomanda	1000	2100	1	plise	1
TEHNIČNI PROSTOR	O-07	kip	monokomanda	1500	800	1	fiksni	1
STOPNIŠČE	O-08	kip	monokomanda	1500	800	1	fiksni	1
HODNIK	O-09	enokrilno	monokomanda	1000	800	1	fiksni	1
KOPALNICA	O-10	kip	monokomanda	1500	800	1	fiksni	1
SPALNICA	O-11	enokrilno spojeno z O-12	monokomanda	1000	1200	1	rolo	1
SPALNICA	O-12	fiksno spojeno z O-11	monokomanda	2000	1200	1	/	0
KABINET	O-13	dvokrilno s pokončnikom	monokomanda	2000	1200	1	2x rolo	2
OTORŠKA SOBA 2	O-14	dvokrilno s pokončnikom	monokomanda	2000	1200	1	2x rolo	2
OTROŠKA SOBA 1	O-15	dvokrilno s pokončnikom	monokomanda	2000	1200	1	2x rolo	2
Skupaj						15	Skupaj	16

OSTALO

DELA, KI NISO ZAJETA V PONUDBI NOAH:

- geodetski posnetek parcele, geološko geomehansko poročilo, zakoličba objekta, varnostni načrt, nadzornik stranke
- vsa osnovna gradbena dela kot so: zemeljska dela, izvedba temeljne plošče, kleti
- komunalna ureditev parcele
- ureditev okolice
- ograditev gradbišča
- zabojnik za gradbene odpadke in odvoz*
- dobava in montaža svetil
- nadstreški, terase, podnice, pergole, lope ipd.

***V kolikor kupec ne poskrbi za redni odvoz odpadkov (zabojnik ali odvoz min. 2x tedensko) lahko prodajalec naroči zabojnik za odpadke v imenu in na račun kupca!**

Kupec je dolžan urediti in pridobiti elektro-gradbiščno omarico ter uporabo električne energije pri montaži elementov hiše na strošek naročnika/investitorja.

PLAČILNI POGOJI:

PLAČILNI POGOJI - ZUNAJ

DOKONČAN OBJEKT *

10 % 5 dni po podpisu pogodbe
45 % 28 dni pred pričetkom montaže

40 % ob zaključku vseh dogovorjenih del

5 % po primopredaji objekta

ROKI IZVEDBE:

Za primer podpisa pogodbe **ZUNAJ DOKONČAN OBJEKT** je rok izvedbe **50 DELOVNIH dni** od pričetka montaže objekta.

*izvedba fasade ni vezana na plačilne obroke, saj je odvisna od vremena in se izvede najkasneje do primopredaje objekta

PLAČILNI POGOJI - DELNI KLJUČ*

10 % 5 dni po podpisu pogodbe
45 % 28 dni pred pričetkom montaže ali takoj po montaži in z ustreznim zavarovanjem plačila

15 % po dokončanju grobih strojnih in elektro inštalacij

15 % po dokončanju estrihov

10 % ob zaključku vseh dogovorjenih del

5 % po primopredaji objekta

ROKI IZVEDBE:

Za primer podpisa pogodbe **DELNI KLJUČ** je rok izvedbe **70 DELOVNIH dni** od pričetka montaže objekta.

PLAČILNI POGOJI - NOAH KLJUČ*

10 % 5 dni po podpisu pogodbe
45 % 28 dni pred pričetkom montaže ali takoj po montaži in z ustreznim zavarovanjem plačila

25 % po dokončanju grobih strojnih in elektro inštalacij

7 % po izdelavi estrihov

8 % po položitvi talnih oblog

5 % po primopredaji objekta

ROKI IZVEDBE:

Za primer podpisa pogodbe **NOAH KLJUČ** je rok izvedbe **120 DELOVNIH dni** od pričetka montaže objekta.

V kolikor pride do kombiniranja in dodajanja storitev k naročeni fazi, se rok izvedbe podaljša in individualno dogovori!

VELJAVNOST PONUDBE:

Veljavnost ponudbe: 30 dni od datuma ponudbe. V kolikor ponudba ni datirana velja 30 dni od prejema oz. do preklica oz. do objave novega cenika.

Veselimo se vašega klica in smo vam v primeru vprašanj z veseljem na razpolago.

Z lepimi pozdravi,

Ekipa NOAH

Kontakti:

TINA ADLER, tina@noah.si; 051 332 978

ALENKA GOMBOC, alenka@noah.si, 051 360 433

DUŠAN BEŠTER, dusan@noah.si ; 051 248 505

NINA KOKOL, nina@noah.si, 08 205 73 93

PRIMOŽ GOMBOC, primoz@noah.si, 041 711 446

ANDREJA HOHNJEC, andreja@noah.si, 031 723 076
